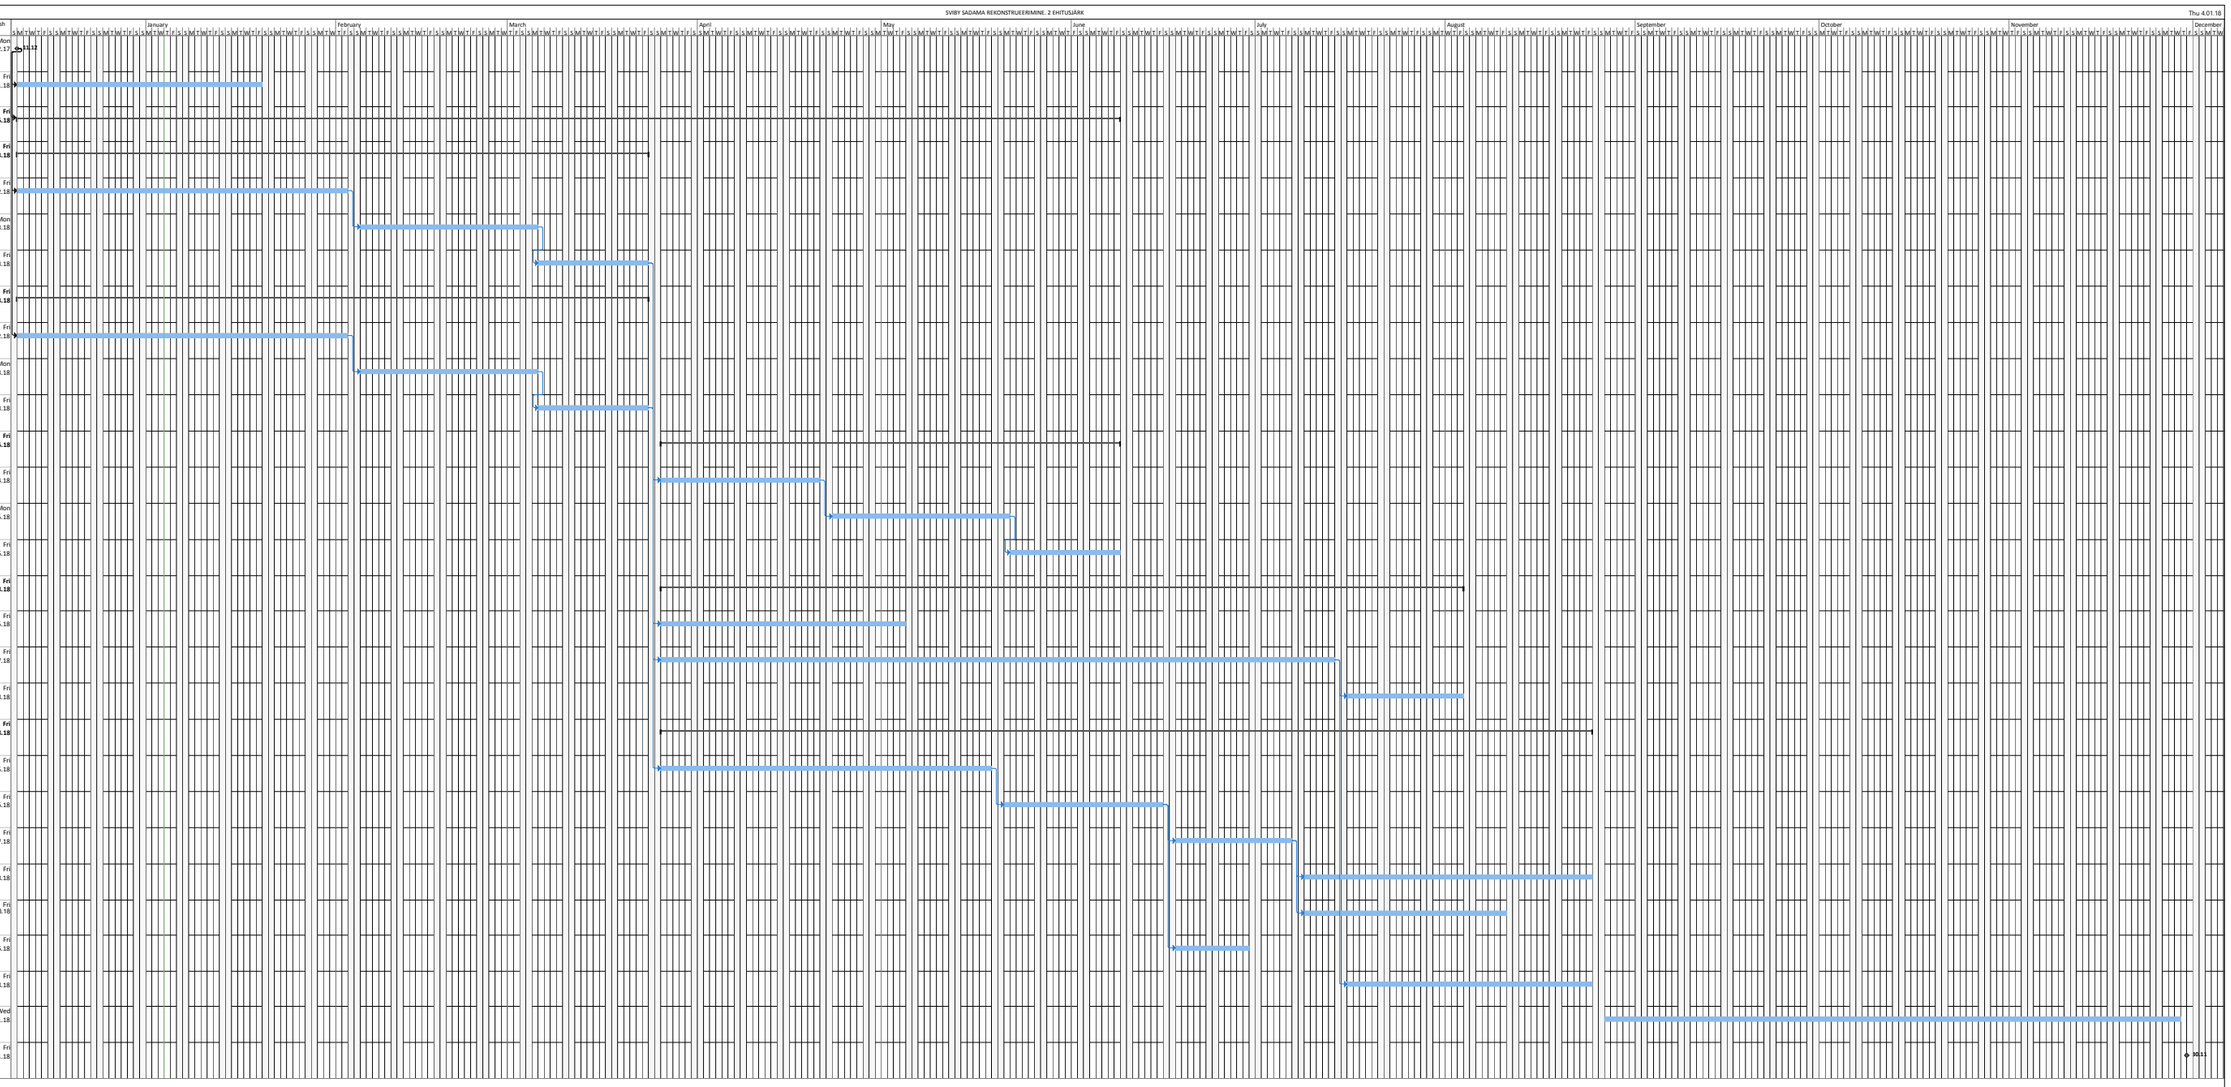ID	Töö nimetus	Kestvus	Start	Finish
1	Alustamiskuupäev	0 days	Mon 1.12.17	Mon 1.12.17
2	**Geodeetilised uuringud**	30 days	Mon 1.12.17	Fri 19.01.18
3	**PROJEKTEERIMISTÖÖD**	**130 days**	**Mon 1.12.17**	**Fri 8.06.18**
4	**VEETÖÖTLUSJAAMA PROJEKT**	**75 days**	**Mon 1.12.17**	**Fri 23.03.18**
5	PROJEKTEERIMISTÖÖD	40 days	Mon 1.12.17	Fri 2.02.18
6	EKSPERTIIS	21 days	Mon 5.02.18	Mon 5.03.18
7	EHITUSLOA TAOTLEMINE	14 days	Tue 6.03.18	Fri 23.03.18
8	**TORUSTIKE PROJEKTID**	**75 days**	**Mon 1.12.17**	**Fri 23.03.18**
9	PROJEKTEERIMISTÖÖD	40 days	Mon 1.12.17	Fri 2.02.18
10	EKSPERTIIS	21 days	Mon 5.02.18	Mon 5.03.18
11	EHITUSLOA TAOTLEMINE	14 days	Tue 6.03.18	Fri 23.03.18
12	**LAMMUTUSPROJEKTID**	**55 days**	**Mon 6.03.18**	**Fri 8.06.18**
13	PROJEKTEERIMISTÖÖD	20 days	Mon 6.03.18	Fri 20.04.18
14	EKSPERTIIS	21 days	Mon 3.04.18	Mon 21.05.18
15	LAMMUTUSLOA TAOTLEMINE	14 days	Tue 2.05.18	Fri 8.06.18
16	**VÄLISTRASSIDE JA REOVEEPUMPLATE EHITUS**	**95 days**	**Mon 6.03.18**	**Fri 3.08.18**
17	TARNSIITTORUSTIK	30 days	Mon 6.03.18	Fri 4.05.18
18	KUMNA TORUSTIK	80 days	Mon 6.03.18	Fri 13.07.18
19	TAASTAMISTÖÖD	15 days	Mon 6.07.18	Fri 3.08.18
20	**VEETÖÖTLUSJAAMA EHITUS**	**110 days**	**Mon 6.03.18**	**Fri 24.08.18**
21	BETONEERIMISTÖÖD	40 days	Mon 6.03.18	Fri 18.05.18
22	FASSAAD JA KATUSED	20 days	Mon 1.05.18	Fri 15.06.18
23	VIIMISTLUSTÖÖD	15 days	Mon 8.06.18	Fri 6.07.18
24	TEHNOSÜSTEEMID	35 days	Mon 9.07.18	Fri 24.08.18
25	ELEKTER JA AUTOMAATIKA	25 days	Mon 9.07.18	Fri 10.08.18
26	HEAKORRATÖÖD	10 days	Mon 8.06.18	Fri 29.06.18
27	**LAMMUTUSTÖÖD**	30 days	Mon 6.07.18	Fri 24.08.18
28	Katsetused/Kontrolltoimingud sh. Kasutuslubade taotlemine	68 days	Mon 7.08.18	Wed 28.11.18
29	Tööde lõpp	0 days	Fri 0.11.18	Fri 30.11.18
